


२०७५ श्रावण

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण सायल गाउँपालिका

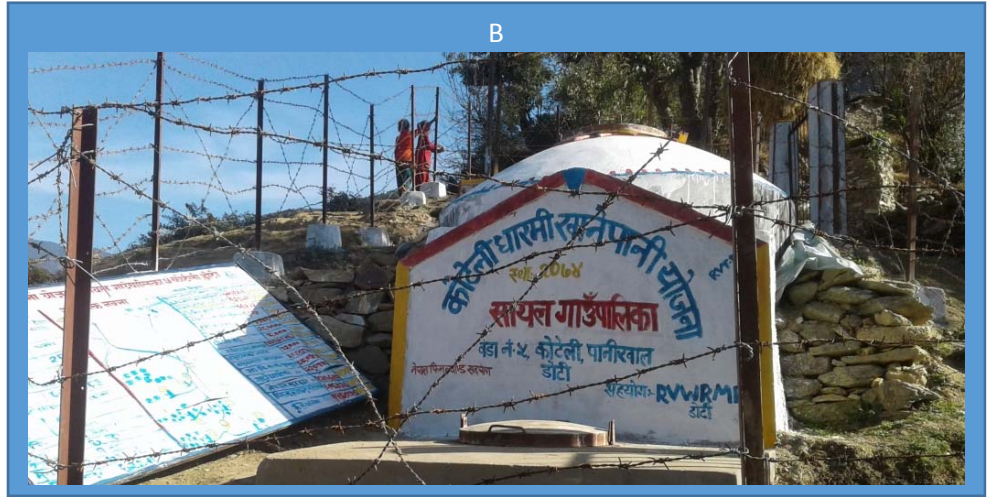

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को

वार्षिक

प्रगति प्रतिवेदन



सायलगाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
डौँड, डोटी
प्रदेश नं. ७, नेपाल



ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना
प्राविधिक सहयोग इकाई
सिलगढी, डोटी

विषय सूची

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश.....	2
१. पृष्ठभूमी.....	5
२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी.....	6
२.१. जलउपयोग गुरुयोजना.....	6
२.२. भौतिक प्रगति.....	6
२.३. क्षमता विकास	7
२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम.....	8
३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन.....	9
४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा.....	10
५. नीति तर्जुमा.....	11
६. सहकार्य	11
७. आइपरेका समस्याहरु.....	11
अनुसूची १ : यस आ.व.मा संचालित योजनाहरुको विवरण	13
अनुसूची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण	14
अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण.....	17
अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरु तथा सफलताका कथाहरु	21
अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी.....	23
अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण.....	24

तालिका सूची

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति
तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी
तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण
तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश
तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण
तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण
तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण
तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण
तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु
तालिका १० : अनुगमनमा आँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयन
तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक
तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा सहकार्य
तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को प्रगती सारांश

स्थानीय तहको नाम:	सायल गाउँपालिका
परियोजनाको नाम :	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चरण
प्रतिवेदनको समयावधि	१ श्रावण २०७४ देखि ३१ आषाढ २०७५ (16 th July 2017 to 16 th July 2018)

क. आर्थिक प्रगती सारांश

परियोजनाको लागि यस	शीर्षक	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
आ.व.को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा) (दातृ निकाय, नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह समेत)	पूँजीगत	७०३९६७०।५९	७०३९६७०।५९	७०३९६७०।५९	१००
	कार्यक्रम/चालु:	६६९००००।००	६६९००००।००	६४७४८२२।००	९८
	जम्मा	९३६४९६७०।५९	९३६४९६७०।५९	९३५०६४९२।५९	९९
श्रोतगत रूपमा आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्चको अवस्था (रु हजारमा)	लगानीको स्रोत	बजेट	निकास	खर्च	खर्च %
	स्थानीय तह	९९२४६७०।५९	९९२४६७०।५९	९९२४६७०।५९	१००
	नेपाल सरकार	४६२२०००।००	४६२२०००।००	४६२२०००।००	१००
	दातृ निकाय (GoF/EU)	७०९५०००।००	७०९५०००।००	६९५९८२२।००	९८
	जम्मा	९३६४९६७०।५९	९३६४९६७०।५९	९३५०६४९२।५९	९९

ख. भौतिक प्रगती सारांश

नतिजा क्षेत्र	आर्थिक वर्षको बुँदागत प्रमुख उपलब्धी
नतिजा १ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> १ वटा खानेपानी योजना सम्पन्न (कोटेली धारमी खा.पा.यो.) ३ वटा खानेपानी योजना निर्माणाधिन अवस्थामा - (भवानी खा.पा., दैना खा.पा,ओखलेनी खा.पा), १ वटा कालाढुंगा विद्यालय शौचालय योजना निर्माणाधिन अवस्थामा । हालसम्म निर्माण भई प्रयोगमा आएका चर्पी संख्या – २६८६, साबुन पानीले हात धुने अभ्यास गर्ने घरधुरी संख्या – १६०९ भाडा सुकाउने चाड – ११९३ (साधारण-६४४, पक्की-४६९), भाडा माभने जुठ्यान – १५४९ (कच्ची- ८२९, पक्की-७२८) फोहर फाल्ने खाडल तयार गर्ने घरधुरी –१०९३ खेर गएको पानीको पुनः प्रयोग गर्ने घरधुरी – १०९६

	<ul style="list-style-type: none"> ● खाना/पानी छोपेर राख्ने घरधुरी संख्या – २००१ ● खेरजानेपानीको खाल्टो निर्माण: गर्ने घरधुरी- १०१६ ● सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या १७०
	<ul style="list-style-type: none"> ●
<p>नतिजा २ : जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● १ वटा सिचाई कुलो (तल्लीरवा सिंचाई) योजना निर्माणाधिन अवस्थामा ● घरवारी व्यवस्थापन तालिम घरवारी व्यवस्थापन समूह – २६ ● घरवारी व्यवस्थापन समूहमा आवद्ध घरधुरी- ६८१ ● प्रदर्शनिकका लागि प्लाष्टिक घर निर्माण – १० ● थोपा सिचाई निर्माण – १०
<p>नतिजा ३ : जलवायु परिवर्तन अनुकुलन/प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● सुधारिएको चुलो निर्माण गर्ने घरधुरी संख्या १७० ● सुधारिएको चुलो निर्माण तालिम पाउनेको संख्या ८ जना ● घरवारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी संख्या ६८१ ● घरवारी व्यवस्थापन तालिम लिनेको संख्या ६८१ ● प्लाष्टिक घर निर्माण गर्ने घरधुरी संख्या १० ● योजनाको मुहानमा श्रोत संरक्षण ५ ● योजनाको मुहानमा वृक्षारोपण ५
<p>नतिजा ४ : क्षमता विकास</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम लाभान्वित संख्या ८३२ ● सरसफाइ, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु लाभान्वित संख्या ३२० ● जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ३३३ ● स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु लाभान्वित संख्या २४ ● जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या १६४ ● नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित तालिमहरु लाभान्वित संख्या ८

	<ul style="list-style-type: none">● गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरुलाभान्वित संख्या १८६
--	--

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमि

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश सातका ग्रामीण क्षेत्रमा “न्यायोचित, समतामूलक तथा दिगो रूपमा पानीको उपयोगको माध्यमबाट स्थानीय जनताहरूको जीवनस्तर सुधार तथा जीवीकोपार्जनका अवसरहरूको वृद्धि गर्ने” लक्ष्यका साथ नेपाल सरकार र गणतन्त्र फिनल्याण्ड सरकार बीच सम्झौता भई आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि यस क्षेत्रका १० जिल्लाहरू (अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली, दैलेख र हुम्ला) मा सफलतापूर्वकनिरन्तर सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आरम्भ देखिनै स्थानीय सरकार मातहत कार्यान्वयन भईरहेको छ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे वमोजिम स्थानीय विकास निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। संघ र प्रदेशको संयुक्त अधिकार सूचीमा भएका बाहेक स्थानीय तहका विभिन्न २२ वटा अधिकारहरू नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार स्थानीय स्तरका जनसरोकारका सबै विषयवस्तुहरूको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।

यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि मिति २०७४ साउन २९ मा स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, यस गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो। सोहि समझदारी पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू तथा परियोजनाको स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख भएका प्रावधानहरू मातहत रही आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा किटान गरिएका लक्ष वमोजिम हासिल गरिएका उपलब्धीहरू, आइपरेका समस्याहरू लगायतका विषयहरूलाई विप्लेशन गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परियोजना अन्तर्गत कुल विनियोजित रकम मध्ये १०० प्रतिशत निकास भै ९९ प्रतिशत खर्च भएको छ। जसमध्ये दातृ निकाय तर्फको रु १,३५,१७८।०० अर्को वर्षमा सरी गएको छ। यस स्थानीय तहमा बजेटको तुलनामा ९९% आर्थिक प्रगति हासिल भएको छ।

तर्जुमा गरिएका १ वटा भौतिक निर्माण तर्फका योजनामध्ये १ वटा योजनाहरू सम्पन्न भएको छ भने ५ वटा निर्माणाधिन योजनाहरू आगामी वर्ष समेत निरन्तर रूपमा निर्माण कार्य हुने गरी जिम्मेवारी सरी गएका छन्।

यस प्रतिवेदनमा यस गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत हासिल भएको प्रगति तथा सम्पन्न हुन नसकेकाका क्रियाकलापहरू तथा आइपरेका समस्याहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समिति तथा परियोजना सहयोग इकाई/परियोजना समन्वय कार्यालयलाई समेत भविष्यमा परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि चाल्नु पर्ने आवश्यक कदमको बारेमा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२. लक्ष बमोजिम उपलब्धी

२.१. जलउपयोग गुरुयोजना

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तर्जुमा गर्ने लक्ष राखिएको जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा निम्न बमोजिम प्रगति हासिल भएको छ । जलउपयोग गुरुयोजनासंग सम्बन्धित क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ । जलउपयोग गुरुयोजना सम्बन्धमा यस आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति निम्न बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १ : जलउपयोग गुरुयोजना तर्जुमाको प्रगति स्थिति

लक्ष्य	प्रगति
गाउँपालिका स्तरिय जल उपयोग गुरुयोजना निर्माण-(सायल) case-1	गाउँपालिका स्तरिय परामर्श बैठक सम्पन्न, वडा स्तरिय परामर्श तथा अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्पन्न(वडा नं. २ र ३), गुरुयोजना निर्माणका विभिन्न क्रियाकलाप संचालन भइरहेको बाँकी कामहरु संभौतामा उल्लेख भएबमोजिम गर्न कार्ययोजना पुनरावलोकन गरिएको छ । कार्ययोजना बमोजिम कृयाकलापहरु संचालन भई रहेका छन् ।

२.२. भौतिक प्रगति

यस गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा भौतिक निर्माण तर्फ हासिल गरिएको प्रमुख उपलब्धी बुँदागत रुपमा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. कोटेलीधारमी खापायो सम्पन्न ३९ घ.घु. र २२९ जनसंख्या लाभान्वित
२. २०० घरधुरीमा सुधारिएको चुलो निर्माण भएको
३. ४३० घरधुरीमा पक्की चाँड र जुठयान निर्माण भएको
४. ३ वटा खापायो संभौता भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका
५. १ वटा सिंचाई योजना संभौता भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
६. १ वटा विद्यालय शौचालय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको
७. १० वटा प्लाष्टिक घर निर्माण भई तरकारी खेती गरिएको

तालिका २ : यस आर्थिक वर्षमा हासिल गरिएको भौतिक उपलब्धी

क्र.सं.	योजनाको प्रकार	सम्पन्न गर्ने लक्ष		हासिल भएको उपलब्धी		प्रगती प्रतिशत (%)	
		योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या	योजना संख्या	लाभान्वित जनसंख्या
१	खानेपानी योजनाहरु	१	२२९	१	२२९	१००%	१००%
२	सिंचाई योजनाहरु	०	०	०	०	०	०
३	संस्थागत चर्पीहरु (संख्या)	०	०	०	०	३०%	०
४	घरबारी व्यवस्थापन (घरधुरी)	२९९	१६०९	२८८	१५८४	१००%	१००%
५	सुधारिएको चुल्हो (संख्या)	१५०		१७०		१३३%	१३३%

६	सुधारिएको पानी घट्ट (संख्या)	०	०	०	०	०	०
७						
८						

तपसील बमोजिमको कारणले लक्ष गरिए बमोजिम योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकी लक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

तालिका ३ : लक्ष बमोजिम भौतिक उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण

क्र.सं.	लक्ष बमोजिम उपलब्धी हासिल हुन नसक्नुको कारण	भविष्यमा यस प्रकारको समस्या आउन नदिनको लागि गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको रणनीति
१	सर्वे क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार प्रगति हाँसिल भएको	
२		
३		
४		
५		
६		

गाउँपालिका भित्र परियोजनाको सहयोगमा सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन योजनाहरुको सूची **अनुसूची १**मा दिइएको छ ।

२.३. क्षमता विकास

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा क्षमता विकास तर्फ हासिल भएका प्रमुख उपलब्धीहरु निम्न बमोजिम रहेका छन् ।

१. चरणवद्ध कृयाकलापमा ८३२ जना लाभान्वित
२. सरसफाई स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन तालिममा ४८० जना लाभान्वित
३. जिविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिममा ३६९ जना लाभान्वित
४. स्थानीयश्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरुमा २४ जना लाभान्वित
५. जलउपयोग तथा जिविकोपार्जन ग'रुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमबाट लाभान्वित १६४
६. नविकरणिय उर्जा तथा जलवायु'परिवर्तनसंग सम्बन्धित तालिमबाट लाभान्वित ६ जना
७. गाँउपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमबाट लाभान्वित १८६ जना

तालिका ४ : क्षमता विकास तर्फ प्रशिक्षित जनशक्तिको विवरण सारांश

क्षमता अभिवृद्धि क्रियाकलाप	दलित महिला	दलित प'रुष	जनजाती महिला	जनजाती प'रुष	अन्य महिला	अन्य प'रुष	जम्मा महिला	जम्मा प'रुष
खानेपानी योजना चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिमका तालिम	५६	३०	०	०	४००	३४६	४५६	३७६
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु	७३	६२	०	०	२३५	११०	३०८	१७२

जीविकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरु	३३	६	०	०	२३४	२२	२६७	२८
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरु	५	३	०	०	९	७	१४	१०
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन ग'रुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरु	२९	१२	०	०	४१	८२	७०	९४
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरु	०	०	०	०	०	८	०	८
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु	१९	११	०	०	४७	१०९	६६	१२०
जम्मा								

तालिमको विस्तृत विवरण अनुसूची २ मा दिइएको छ ।

२.४. जीविकोपार्जन कार्यक्रम

यस आर्थिक वर्षमा जीविकोपार्जन तर्फ यस गाउँपालिकामा निम्न बमोजिमको प्रम'ख उपलब्धी हासिल भएको छ ।

१. घरबारी ६२९ घरधुरीमा घरबारी व्यवस्थापन भएको

२. आयआर्जन: २० जना

३. सहकारीका सेयर धनी संख्या ५६४

४. लघु उद्यम आदि: ७

५. स्थानीय स्रोत व्यक्ति उत्पादन: ३२

तालिका ५ : घरबारी व्यवस्थापन गर्ने घरधुरी विवरण

वडा नं.	अघिल्लो आ.व. सम्म				यस आ.व. मा				जम्मा			
	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
६	१४	०	१०९	१२३	३५	०	७८	११३	४९	०	१८७	२३६
५	९	०	१५९	१६८	४	०	१४७	१५१	१३	०	३०६	३१९
४	०	०	०	०	०	०	२४	२४	०	०	२४	२४
जम्मा	२३	०	२६८	२९१	३९	०	२४९	२८८	६२	०	५१७	५७९

तालिका ६ : आयआर्जन सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	आयआर्जन क्रियाकलापहरु	व्यवसाय गर्ने जम्मा व्यक्ति			
		दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	व्यवसायिक तरकारी तथा मसला खेती			१७	१७
२	व्यवसायिक फलफ'ल खेती				
३	लघु उद्यम व्यवसाय	०	०	०	०
४	बह'दृश्यीय नर्सरी व्यवस्थापन	०	०	३	३

५	एग्रोभेट	०	०	०	०
६				
जम्मा					

तालिका ७ : सहकारी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	स'चकहरु	परियोजनाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त सहकारीको नाम			
	
१	सहकारीमा आवद्ध उपभोक्ता समिति संख्या	३			
२	शेयर धनीहरुको संख्या	५६४			
३	क'ल सम्पत्ती रु.	५८२०३७९			
४	क'ल ऋण लगानी रु	५४१५५००			
५	असुली दर	९५%			
६	ख'द नाफा रु	६४७३३			
७	मर्मत सम्भार कोष विनियोजन रु	६५५४२			
८	जगेडा कोष रु.	५३८९०९			
९	सञ्चालन आत्मनिर्भरता	११५%			

हरेक सहकारीको विस्तृत विवरण अनुसूचि ३ मा दिइएको छ ।

३. अनुगमन तथा प्रतिवेदन

गाउँपालिका तथा स्थानीय प'र्वाधार विकास विभाग तथा कृषि सडक विभाग बीच सम्पन्न समझदारी बमोजिम यस गाउँपालिकामा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको नियमित रूपमा अन'गमन गर्नको लागि मिति मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिएको छ । (यदि गठन गरिएको छैन भने कहिले गर्ने हो उल्लेख गर्ने)

तालिका ८ : योजनास्तरमा गरिएको अनुगमनको विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	चरणवद्ध कार्यपद्धति बमोजिम अन'गमन संख्या	स्थलगत गरिएको संख्या	अनुगमन संख्या	गाउँपालिका कार्यालयबाट अनुगमनमा सहभागि भएको संख्या
१	कोटेली खा.पा.	३		३	३
२	दैनौ खापायो	२		२	२
३	भवानी खापायो	२		२	२
४	ओखलेनी खापायो	२		२	२
५	तल्लीरवा सिंचाई	२		२	२
६	कालाहुंगा शौचालय	२	२		१
जम्मा					

तालिका ९ : गाउँपालिकाबाट परियोजनामा पेश भएका प्रतिवेदनहरु

क्र.सं.	प्रतिवेदन	आ.व. पेश गर्न पर्ने संख्या	समयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन संख्या	समयमा पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदन संख्या
१	मासिक आर्थिक प्रतिवेदन (फाँटवारी)	१२	१२	१२
२	चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	३	३	३
३	वार्षिक प्रतिवेदन	१	१	१
	जम्मा			

परियोजना सहयोग इकाई तथा परियोजना समन्वय कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा गरिएको जलस्रोत विकास कोषको अन'गमनको क्रममा दिइएका स'भावहरूको कार्यान्वयन निम्न बमोजिम गरिएको छ ।

तालिका १० : अन'गमनमा आँलाइएका स'भावहरूको कार्यान्वयन

क्र.सं.	अन'गमन मिति	अन'गमन टोलीले दिएको स'भाव	स'भावको कार्यान्वयन विवरण
१	१६।०५।२०१८	सबै विषयहरू राम्रो भेटिएको	
२	२०।११।२०१७	जलस्रोत सल्लाहकारको सिफारिस हुनुपर्ने	सिफारिस गर्ने गरिएको
३			

जलस्रोत विकास कोषको सम्प'र्ण खर्च रकम तोकिएको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । ग्रामीण जलस्रोत आर्थिक वर्षमा भएको आम्दानी खर्चको भएको रकमको विवरण गाउँपालिकाको सूचना पाटीमा मिति मा प्रकाशित गरिएको छ । वा वेबसाइटमा राखिएको वा ।

४. प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा

विभिन्न मितिमा परियोजनाका क्रियाकलापहरूको प्रगती समीक्षा तथा परियोजनाको कार्यान्वयनको विषयमा गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएको छ ।

तालिका ११ : गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठक

बैठक नं.	मिति	प्रमुख छलफल तथा निर्णयहरू
१	३०।०८।२०१७	गाउँपालिका परियोजना व्यवस्थापन समितिको गठन र सहयोगी व्यक्तिको संझौता थप गर्ने सम्बन्धमा
२	०९।११।२०१७	विभिन्न तालिमहरू संचालन गर्ने सम्बन्धमा
३	३१।०१।२०१८	सुधारिएको चुलो सम्बन्धि संझौता र पूर्ण सरसफाई संरचना प्रवर्धन
४	१०।०५।२०१८	वार्षिक योजना पुनरावलोकन
५	१३।०७।२०१८	कर्मचारीको करारको म्याद थप सम्बन्धमा
६		
७		
८		

९		
१०		
११		
१२		

५. नीति तर्जुमा

गाउँपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता एवं महिनावारी व्यवस्थापन तथा जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन क्षेत्रमा निम्न बमोजिमका नीतिहरु तर्जुमा गरेको छ ।

- गाउँपालिकाबाट संचालन गरिने खानेपानी योजनाहरु नीजि धारा जडान गर्ने गरी मात्र संचालन गरिने ।
- पूर्ण सरसफाईयुक्त गाउँपालिकाको प्रकृत्यामा गाउँपालिका भित्रका प्रत्येक घरधुरीमा अनिवार्यरूपमा चाँडै, जुठ्यान र सुधारिएको चुलो निर्माण कार्य अगाडी बढाउने ।
- गाउँपालिकाको पूर्ण सरसफाई रणनीति तयार गर्ने ।

६. सहकार्य

परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजनासँग सम्बन्धित योजना क्रियाकलापहरुमा गाउँपालिकाका विषयगत शाखाहरु र अन्य साभेदार निकायहरुबाट थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग -परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट भन्दा बाहेक) उपलब्ध भएको छ ।

तालिका १२ : परियोजनासँग सम्बन्धित कृत्याकलापहरुमा सहकार्य

क्र.सं.	निकायको नाम	कार्यक्रम	सहकार्यको प्रकार	सहकार्यको रकम रु. (वा बराबर)
१	घरेलु तथा सानाउद्योग विकास समिति	सुधारिएको चुलो	आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य	३५०००।

७. आइपरेका समस्याहरु

त्र्यार्षिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा निम्न बमोजिमका समस्याहरु आइपरेका थिए जसको समाधान निम्न उपायहरुबाट गरिएको थियो ।

तालिका १३ : आइपरेका समस्याहरु तथा समाधानका प्रयासहरु

क्र.सं.	समस्याहरु	समाधानका प्रयासहरु
१	विभिन्न संघसस्थाहरुको भत्ताम'खि कार्यक्रमका कारण विभिन्न क्रियाकलाप संचालनमा असजिलो	परियोजनाको नीति नियमहरुको बारेमा प्रष्ट पारी भत्ताम'खि भन्दा प्रतिफलको बारे जानकारी गराउने

	हुने गरेको	गरेको
२	पटक पटक वार्षिक बजेट परिमार्जन हुने कारणले कार्यक्रम संचालनमा अन्योल	वार्षिक कार्यक्रम अन'शार निर्दीष्ट कार्यक्रम संचालन गरेर
३	एउटै व्यक्ति धेरै सम'हमा आवद्ध भएकाले सहभागीमा कमि	समयान'क'ल मिलाएर कार्यक्रम संचालन गरेर
४	अपनत्वको कमिका कारण खानेपानी तथा सरसफाइ संचालन तथा निरन्तरतामा कमी	सरोकार ब्यक्तीहरुलाई अपनत्वको भावना जगाएर
५	भौगोलिक विकटताका कारण काममा गाह्रो हुने गरेको	प्रत्यक्ष सहभागीतामा समय र पाईक पर्ने स्थानमा कार्यक्रम संचालन गरेर

मा संचालित योजनाहरूको विवरण

वडा नं.	योजनाको अन'मानित लागत (रु)	यस योजनामा हालसम्म भएको खर्च (रु)	यस आ.व.मा भएको खर्च (रु)	यस योजनामा गाउँपालिकाको खर्च	आगामी आ.व.मा क्रमागत भई जाने आयोजनाको संख्या	आगामी आ.व.मा ह'ने खर्चको लक्ष	यस आ.व.मा सम्पन्न आयोजना बाट लाभान्वीत जनसंख्या
योजना							
5	4,115,595.61	1339139	1339139	288,092.0	1	2776456.61	715
6	5,282,786.27	1,505,594.0	1,505,594.0	369,756.0	1	3777192.27	
5	1,777,671.50	649,077.83	649,077.83	124,438.0	1	1128593.67	76
	11176053.4	3493810.83	3493810.83	782286	3	7682242.55	
4	3,637,202.40	1,042,808.68	1,042,808.68	256603.51	1	2594393.72	467
	3,637,202.40	1,042,808.68	1,042,808.68	256603.51	1	2594393.72	467
4	780,328.55	335,836.0	335,836.0	85,836.0	1	444492.55	210
	780,328.55	335,836.0	335,836.0	85,836.0	1	444492.55	210
वडा. 1 देखी 6 का सम्प'र्ण घरध'री		1,167,392.0	1,167,392.0	579,945.0			

अन'स'ची २ : यस आ.व.मा संचालित तालिमहरुको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित तालिमको नाम	वडा नं.	तालिमको अवधि	तालिम संख्या	दलित महिला	दलित प'रुष	जनजाती महिला	जनजाती प'रुष	अन्य महिला	अन्य प'रुष
खानेपानी योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति वमोजिमका तालिम										
१	निर्माण प'र्वको तालिम		१	३	५	०	०	०	३८	३६
२	सम'दायिक कार्ययोजना निर्माण तालिम		२	३	१४	९	०	०	२९	३३
३	उपभोक्ता व्यवस्थापन तालिम		३	४	०	०	०	४	२०	२५
४	निर्माण चरणको तालिम		१	३	१३	१०	०	०	१७	२३
५	उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक लेखा व्यवस्थापन तालिम		१	३	७	४	०	०	८	१२
६	उपभोक्ता समितिलाई सामाजिक समावेशकरण तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धि तालिम		१	३	१	१	०	०	१७	१९
७	घरवारी व्यवस्थापन तालिम		१	२	१	१			१७	१९
८	परियोजना सम्बन्धि अभिम'खिकरण		१	४	१	१	०	०	२८	२९
९	सार्वजनिक स'नवाई/जनलेखा परिक्षण		१	८	१३	४	०	०	१९८	१२६
१०	पानी स'रक्षा सम्बन्धि अभिम'खिकरण		१	१	१	०	०	०	१०	११
११	पानी स'रक्षा सम्बन्धि तालिम		३	२	०	०	०	०	१८	१३
		जम्मा	१६	३६	५६	३०	०	०	४००	३४६
सरसफाई, स्वच्छता तथा महिनावारी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरु										
१	RMWASH-CC लाई पर्ण सरसफाई सम्बन्धि अभिम'खिकरण कार्यक्रम		२	१	७	५	०	०	१०	३८
२	सरसफाई स्वयमसेवकलाई तालिम		५	१	३	२	०	०	०	०
३	महिनावारी सरसफाई सम्बन्धि महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई तालिम		२	२	१२	०	०	०	५४	६

४	महिनावारी सरसफाई सम्बन्धि धामी भक्रिलाई तालिम		२	२	४	१२	०	०	०	३०
५	महिनावारी सरसफाई दिवस		१	१	३३	२	०	०	८३	१०
६	महिनावारी सरसफाईका लागि प्याड निर्माण तालिम		१	१	६	२३	०	०	०	४
६	राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह		७	१	७	१८	०	०	८२	१७
७	SP/fedwasun/Cooperative प्रतिनिधिहरूलाई प'र्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम		३	१	१	०	०	०	६	५
			जम्मा	२३	१०	७३	६२	०	०	२३५
जिवीकोपार्जन तथा सहकारी विकाससंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	घरवारी व्यवस्थापन तालिम	४,५,६	३ दिन	१०	३३	६	०	०	२३१	१८
२	प्लाष्टीक घर निर्माण तालिम	४,५,६	३ दिन	१	०	०	०	०	३	४
			जम्मा	११	३३	६	०	०	२३४	२२
स्थानीय स्रोत व्यक्ति विकाससंग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमहरू										
१	अगुवा कृषक तालिम	४,५,६	५ दिन	१	२	१	०	०	९	४
२	बहुउदेशिय नर्सरी नाईके तालिम	४,५,६	५ दिन	१	०	०	०	०	०	३
३	स्थानिय स्रोत व्यक्तिलाई सरसफाई तालिम -(LRP)		५ दिन	१	३	२	०	०	०	०
			जम्मा	३	५	३	०	०	९	७
जलउपयोग तथा जीविकोपार्जन कार्यान्वयन गुरुयोजनासंग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	गाउँपालिका स्तरिय परामर्श बैठक		१	१	२	३	०	०	६	१६
२	व डा स्तरिय दलित, महिला, तथा पछाडी परिएका बर्गहरूका लागि आत्म विश्वास अभिवृदि कार्यशाला	२,३	२	१	६	६	०	०	१३	५५
३	व डा स्तरिय क्षमता अभिवृदि कार्यशाला	२,३	२	१	२१	३	०	०	२२	११
			जम्मा	५	२९	१२	०	०	४१	८२
नवीकरणीय उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन संग सम्बन्धित तालिमहरू										
१	सुधारिएको चुलो निर्माण सम्बन्धि		८	१	०	०	०	०	०	८

	तालिम									
		जम्मा		१	०	०	०	०	०	८
गाउँपालिका तथा जिल्ला स्तरीय क्षमता विकास तालिमहरु										
	RMWASH-CCलाई पुर्ण सरसफाई तालिम		२	१	७	५	०	०	१०	३८
	गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी योजनाको दिगोपना सम्बन्धि तालिम	गाउँपालिका	३	१	४	२	०	०	२१	३५
	गाउँपालिका स्तरीय पानी अधिकार तथा पानी सुरक्षा तालिम	गाउँपालिका	३	१	७	३	०	०	१०	२७
	Technical capacity enhancement training on Climate Resilience and Risk Reduction in WS	दिपायल	३	१	०	०	०	०	०	४
	SP/FESDWASUN/Cooperative प्रतिनिधिहरुलाई पुर्ण सरसफाई सम्बन्धि तालिम	दिपायल	३	१	१	१	०	०	६	५
		जम्मा		५	१९	११	०	०	४७	१०९

अनुसूची ३ : सहकारी संस्थाको विवरण

सहकारी संस्थाको नाम : लगनशिल महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि सायल

क) संगठन तर्फ

क.सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुको आवद्धता

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सामुदायिक संस्था/कृषि समूह	संख्या	१३१४६		
२	उपभोक्ता समिति	संख्या	३		
३	अन्य संस्थाहरु	संख्या			
क	संख्या			
ख	संख्या			

ख. शेयर सदस्य

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	महिला सदस्य	संख्या	५३५	२९	५६४
२	पुरुष सदस्य	संख्या			
ग. जातियताको आधारमा					
१	दलित	संख्या	११०	२५	१३५
	जनजाति	संख्या			
	अन्य	संख्या			

२.पूँजी निर्माण

क्र.सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	शेयर रकम	रु.	४७८४००	६३५९००	
२	निक्षेप (बचत)	रु.	२७३२३६७	३८९१५६५	
३	जगेडा कोष	रु.	५३०६८७	५३८९०९ पौष सम्म	वार्षिक रुपमा मात्र

४	मर्मत संभार राहत कोष	रु.	०	६५५४२	वार्षिक नाफावाट
५	खुद नाफा	रु.	८२२२	६४७३३ पौष सम्म	
६	कुल सम्पति	रु.	४१७०६८०	५८२०३७९	सन्तुलन परीक्षणवाट

३. पूँजी परिचालन (प्रत्येक आ.व को मात्र)

क. ऋण लगानी

क्र.सं	लगानी क्षेत्र	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	लाभान्वित सदस्य संख्या
१	कृषि	रु.	१२०००००	२००००००	
२	पशुपालन	रु.	५०००००	८०००००	
३	व्यापार	रु.	१५०००००	१८०००००	
४	वैदेशिक रोजगार	रु.	३०००००	५०००००	
५	अन्य	रु.	१३७४१९	३१५५००	
कुल जम्मा		रु.	३६३७४१९	५४१५५००	

नगद मौज्जात रु

वैक मौज्जात रु.....

४ असूली, आम्दानी तथा खर्चको विवरण

क्र. सं	विवरण	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	सांवा असूली	रु.			
२	व्याज तथा हर्जाना असूली	रु.	४०३९०५		
३	अन्य आम्दानी	रु.	८९६३५		
४	पाउनु पर्ने व्याज बाँकी	रु.	४१०३५		
५	भाखा नाधेको रकम	रु.	३००००		
६	लगानीमा रहिरहेको रकम (ल.र.र)	रु.	३६३७४१९		
७	असूली दर	प्रतिशत	९०%		सूत्र= (1+2)/(1+2+4+5)x100
क	कूल आम्दानी(२+३)	रु.			
८	संचालन खर्च	रु.			
९	व्याज खर्च	रु.		२३८०१२	

१०	ऋण सुरक्षण व्यवस्था खर्च/कोष	रु.	१६८०४४		वार्षिक खातावन्दी मा मात्र
ख	कूल खर्च(८+९+१०)	रु.			
ग	खुद नाफा (क-ख)	रु.	८२२२	६४७३३	
११	संचालन आत्मनिर्भरता (OSS)	प्रतिशत	११५%	११५%	सूत्र=(२+३)/ख

(५) सहकारी शिक्षा तथा अन्य तालिम

क्र. सं.	तालिमको नाम	इकाइ	गत खातावन्दी सम्मको	यस खातावन्दी सम्मको	कैफियत
१	नेतृत्व विकास	सहभागी संख्या	५०	४५	
२	संस्थागत विकास	सहभागी संख्या	१५		
३	लेखाव्यवस्थापन	सहभागी संख्या	१५	१	
४	सहकारी शिक्षा	सहभागी संख्या	२००	१००	

६ वाह्य ऋण कारोवारको स्थिति

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाम	यस आ.व. मा भएको कारोवार मात्र (रु मा)			
	लिएको सांवा ऋण रकम	तिरेको सांवा ऋण रकम	तिरेको व्याज रकम	वांकी तिर्नु पर्ने सांवा रकम
महिला तथा बालबालिका कार्यलय	५००००		१०००	५००००

(७) विभिन्न समितिहरुको विवरण

क्र. सं.	समितिहरु	महिला	पुरुष	दलित	जनजाती	अन्य	जम्मा
१	संचालक समिति	८		१			९
२	लेखा समिति	२		१			३
३	कर्मचारीहरु	२					३

(८) सम्बन्ध र सर्म्पक विकास:

निकाय _____ के काम _____ उपलब्धि _____

- सायल गा.पा. आर्थिक सहयोग
- ग्रामिण विकास केन्द्र आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास सहयोग
- ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास सहयोग

४. महिला तथा बालबालिका कार्यलय	आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास सहयोग
५. डिभिजन सहकारि	आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास सहयोग
६. जिल्ला सहकारि संघ	आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास सहयोग
७. समाजसेवा डोटि	आर्थिक सहयोग, क्षमता विकास सहयोग
८. जिल्ला कृषी कार्यालय	कृषक समुह, बोटबिरुवा बितरण, तरकारि बिउ, कृषी प्रविधि सहयोग

अनुसूची ४ : गाउँपालिकाका नमूना उपलब्धीहरू तथा सफलताका कथाहरू

सायल गाउँपालिकामै सरसफाई उन्मुख नमुना वस्ती; कोटेली वस्ती

कोटेली धारमी सायल गाउँपालिका वडा नं. ५ मा अवस्थित ३९ घरधुरी रहेको वस्ती हो । यस वस्तीमा महिला ९२ र पुरुष १२९ गरी जम्मा २२१ जनसंख्या रहेको छ । परियोजनाका कार्यक्रम संचालन हुन अगाडी यस वस्तीमा रहेको खानेपानी योजना पूर्ण रूपमा जिर्ण भईसकेकाले समुदायको पानीसंगको पहुँच सहज थियो । समुदायलाई पानी भरेर घर सम्म ल्याउन १ घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था थियो । समुदायका केही घरधुरी वर्षातमा फुट्न मौसमी मुलहरूमा निर्भर थिए भने केहि घरधुरीहरू खोलाको पानी पिउन बाध्य थिए । खोलाको मुहान पहिरोको जोखिममा रहेको र वर्षातमा पानी दुषित हुने अवस्था थियो । पानीको अपर्याप्तताले गर्दा समुदायमा शौचालयको पूर्ण प्रयोग हुन नसक्दा खुला दिसाँमुक्तको अवस्था कायम हुन सकेको थिएन । समुदायमा आधारभुत सरसफाई नै ब्यवस्थित हुन नसक्दा पूर्ण सरसफाई ब्यवस्थापन गर्ने विषय समुदायको लागि अत्यन्त जटिल थियो । हरीयो सागपात, तरकारी उत्पादन र पोषणयुक्त खाने कुराहरू अनिवार्य रूपमा सेवन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चासो र ज्ञानको कमी थियो भने तरकारी खेती गर्न चाहने हरुका लागि पानीको अभावले गर्दा वर्षे तरकारी मात्र उत्पादन हुन्थ्यो । साथै सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले काठदाउरा कटानी रोक लागेका कारण पर्याप्त दाउरा आपूर्तिमा कठिनाई भएकाले जिविकोपार्जन सहज अवस्थामा थिएन ।

गत आ.व. २०७४/२०७५ मा सायल गाउँपालिका/ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाबाट संचालित कोटेली धारमी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाले हाल समुदायमा परिवर्तनको आभास भएको छ । कोटेली धारमी खानेपानी तथा सरसफाई योजना कार्यान्वयनका क्रममा संचालन गरिएका विभिन्न जनचेतनामुलक कृयाकलापहरू पूर्ण सरसफाई अभिमुखिकरण, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन तालिम, घरवारी ब्यवस्थापन तालिम, सामाजिक समावेशीकरण तथा लैङ्गिक समानता तालिम, सधारिएको चुलो निर्माण, चाङ्ग, जुठयान आदि कृयाकलापहरूबाट समुदायको चेतना स्तर र ब्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिन्छ । हाल यस वस्तीमा ६ वटा खानेपानी योजनाका धाराहरू निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा रहेका छन् । जसले पानीको सुविधा स्तर बृद्धिसंगै घरायसी सरसफाई र नियमित शौचालयको प्रयोग भएको छ । यसबाट ३९ वटै घरधुरीमा घरवारी ब्यवस्थापन, नियमित ताजातरकारीको प्रयोग संगै पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार देखिएको छ । सुधारिको चुलो, चाङ्ग, जुठयानको प्रयोग र निर्माणले वातावरण सरसफाईमा र स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकुल असर कम भएको छ । सुधारिएको चुलोको प्रयोगले दाउराको खपत घट्न गई वन जंगल संरक्षणमा टेवा पुगेको छ र वन जंगल संरक्षणका लागि हुने विवादहरू घट्न गएका छन्। यस समुदायमा प्रत्येक घरधुरीमा ३९ वटा चाङ्ग, जुठयान, ३९ वटा सुधारिएको चुलो ३९ वटा घरधुरीमा गोठेमल ब्यवस्थापन र प्रत्येक घरमा फोहोर ब्यवस्थापन खाल्डो निर्माण गरी प्रयोगमा आएको छ । धारामा खेरगएको पानी संकलन गरी घरवारी ब्यवस्थापनमा प्रयोग गरिएको छ । कोटेली वस्तीमा भएको सरसफाई युक्त कार्यले गाउँपालिका भित्रका अन्य वस्तीहरूमा पनि यसको सिकाइले आगामी दिनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

यस कोटेलीधारमी वस्तीमा निरन्तर मासिक बैठक, मासिक पानी शुल्क संकलन, मर्मत संभार कोषको स्थापना, ग्रामीण मर्मत संभार कार्यकर्ता नियमित परिचालन भएकाले समुदाय योजनाको दिगोपनामा ढुक्क छन् ।

अनुसूची ५ : भिजिबिलिटी

गाउँपालिका अन्तर्गत ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका क्रियाकलापहरूको उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा आम जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षमा तपसील बमोजिमका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको छ ।

क्र.सं.	माध्यम	मिति	प्रसारण गरिएको विषयवस्तु
१	पत्रिका	२०७४/११/१३	सिलबन्दि दरभाउपत्र को सुचना प्रकासन ।
	रेडियो		
३	टेलिभिजन		
४	सामाजिक सञ्जाल		
५	प्रदर्शनी		
६	श्रव्य दृष्य सामग्रीहरू		
७	अन्य सूचना शिक्षा सञ्चार सामग्रीहरू		

उपरोक्त भिजिबिलिटी सम्बन्धी सामग्रीहरूको प्रति संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची ६ : जनशक्ति विवरण

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यस गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा गाउँकार्यपालिका कार्यालय, परियोजना, परियोजना सहयोग इकाई तथा सहयोगी संस्थाहरुबाट तपसील बमोजिम जनशक्ति परिचालन भएका थिए ।

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	कार्यालय	पद	जम्मा अनुमानित योगदान (महिनामा)	कैफियत
१	भरत बहादुर कठायत	सायल/RVWRMP	फिल्ड संयोजक		
२	डबल शाही	सायल/RVWRMP	जलस्रोत प्राविधिक		
३	खडक वि. क.	सायल/RVWRMP	स्वास्थ्य सरसफाई		
४	बिनोद खड्का	सायल/RVWRMP	जिविकोपार्जन प्रवर्धक		
५	लोग ब. भाट	सायल/RVWRMP	सब इन्जिनियर		
६	धन बहादुर बिष्ट	सायल/RVWRMP	सब इन्जिनियर		हाल नियमित भयको
